

基本遵守事項 (工事説明会資料より抜粋)

- 1 作業時間は8:00~18:30、日曜日は休工とする
- 2 7:30~8:30の間は工事車両の搬出入を行わない
- 3 工事現場出入り口には、適宜誘導員を配置する
- 4 道路上には資材等を放置しない
- 5 騒音・振動防止法を遵守する

4 月度安全衛生管理計画

サクラシティ 高尾計画


事業主 : 大和ハウス工業株式会社
 日本住宅流通株式会社
 施工者 :
 事業主 : 大和ハウス工業株式会社
 株式会社コスモスイニシア
 施工者 : 株式会社長谷工コーポレーション

月 間 安 全 衛 生 管 理 工 程 表

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
戸建事業																														
マンション事業																														
安全衛生行事計画	安全大会		休工日							休工日							休工日							休工日						
大型ダンプ																														
大型トラック、トレーラー																														
4tトラック																														
生コン車																														
クレーン																														
1日あたりの車輛台数	200	180	160	140	120	100	80	60	40	20	10																			

【先月までの工事進捗】
 ◎戸建事業
 ・3月末時点着工62棟
 ・3月末時点完成済み57棟。37世帯入居済み。
 ◎マンション事業
 ・I工区(185戸)は予定通り3/31竣工引渡しとなりました。
 ・II工区C、D棟(14F建て)は11F-12Fの躯体工事、1F-9F仕上工事を実施。

【今月度の重点連絡事項】
 ◎戸建事業
 ・4月着工予定1棟。
 ・4月完成予定4棟。
 ◎マンション事業
 ・I工区の入居開始は4/15からの予定です。
 ・II工区C、D棟(14F建て)は13F-14Fの躯体工事、1F-11F仕上工事を実施。
 ※本体のコンクリート工事は5/中旬までに完了の予定です。
 ※コンクリートの鍍押し及び内装検査・是正工事、機器調整作業については、作業時間を延長する事があります。

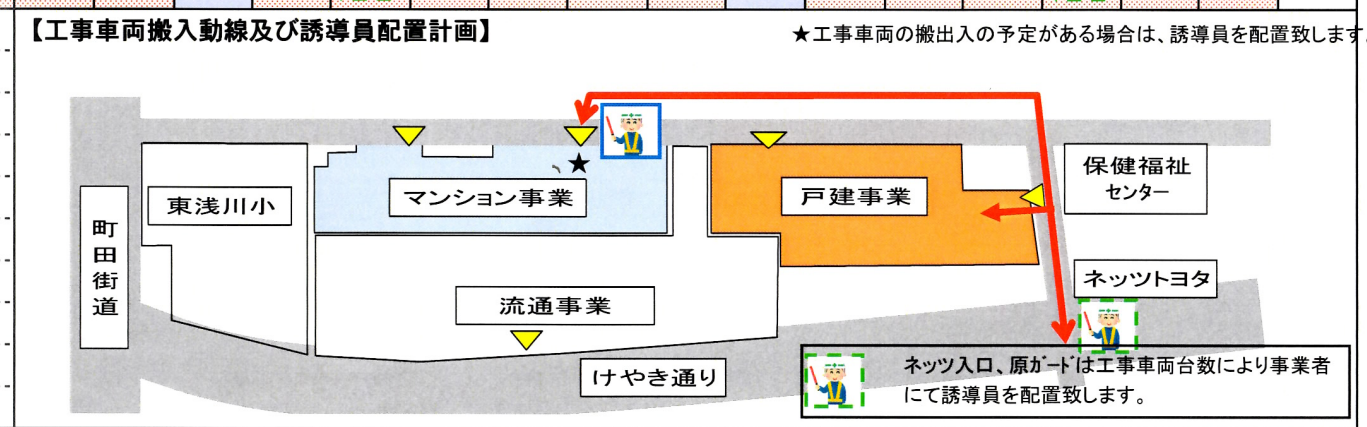

※コンクリート打設作業等中断する事が出来ない作業を除き、可能な限り児童下校のピーク時を避けた計画を行う。

※車両台数は予測台数です。増減が生ずる場合があります。※天候等の理由により日程を変更する場合があります。
