基本厳守事項

1. 作業時間は原則8:00～18:00、日曜日は全休日とする
2. 7:30～8:30の間は工事車両の搬出入を行わない
3. 工事現場出入り口には、適宜誘導員を配置する
4. 歩道・周辺道路の清掃・美化に努める
5. 騒音・振動防止法を厳守する

7月度安全衛生管理計画

工事名	（仮称）スーパーバリュー八王子高尾店新築工事
事業主	株式会社　スーパーバリュー
施工者	株式会社　関東建創

月間安全衛生管理工程表

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
開発工事 山留工事	←					←								南側隣地境界・町田街道側山留H鋼打設						→											
開発工事 土工事	←					←								南側隣地境界造成工事						→							→				
開発工事 擁壁工事	←					←								南側隣地境界間知積・RC擁壁工事						→							→				
開発工事 雨水排水工事	←					←								雨水貯留槽・埋設配管・U字溝工事						→							→				
本体建物工事 仮設・土工事	←					←	基礎埋め戻し							外部足場架設工事						→							→				
本体建物工事 躯体工事	←					←																									
本体建物工事 鉄骨工事														鉄骨建方																	
本体建物工事 内装工事	←					←	耐火被覆吹付・内装間仕切・電気設備工事																				→				
本体建物工事 外装工事														外壁ALC・吹付タイル・屋上防水工事																	
安全衛生行事計画	安全大会		道路清掃							道路清掃			安全大会				道路清掃							道路清掃				連絡会	安全協議会		
大型ダンプ	←					←	敷地内での土砂運搬用として車両の入退場																				→				
トラック（10t・4t）	←					←	基礎～地上躯体工事（鉄筋・型枠・仮設材）							開発工事（鉄筋・型枠・資材）													→				
生コン車・ポンプ車	←					←	基礎～地上躯体工事（コンクリート）																				→				
クレーン	←					←	基礎～地上躯体工事・鉄骨工事（原則現場常駐																				→				
トラック（10t・4t）	←					←	内外装工事（内装資材・ALC・防水材他）																				→				
誘導員（増人）	1名	2名	1名	1名		2名	1名	2名	2名	1名	2名		1名	1名	1名	1名	1名				1名	1名		2名			2名		1名	1名	1名

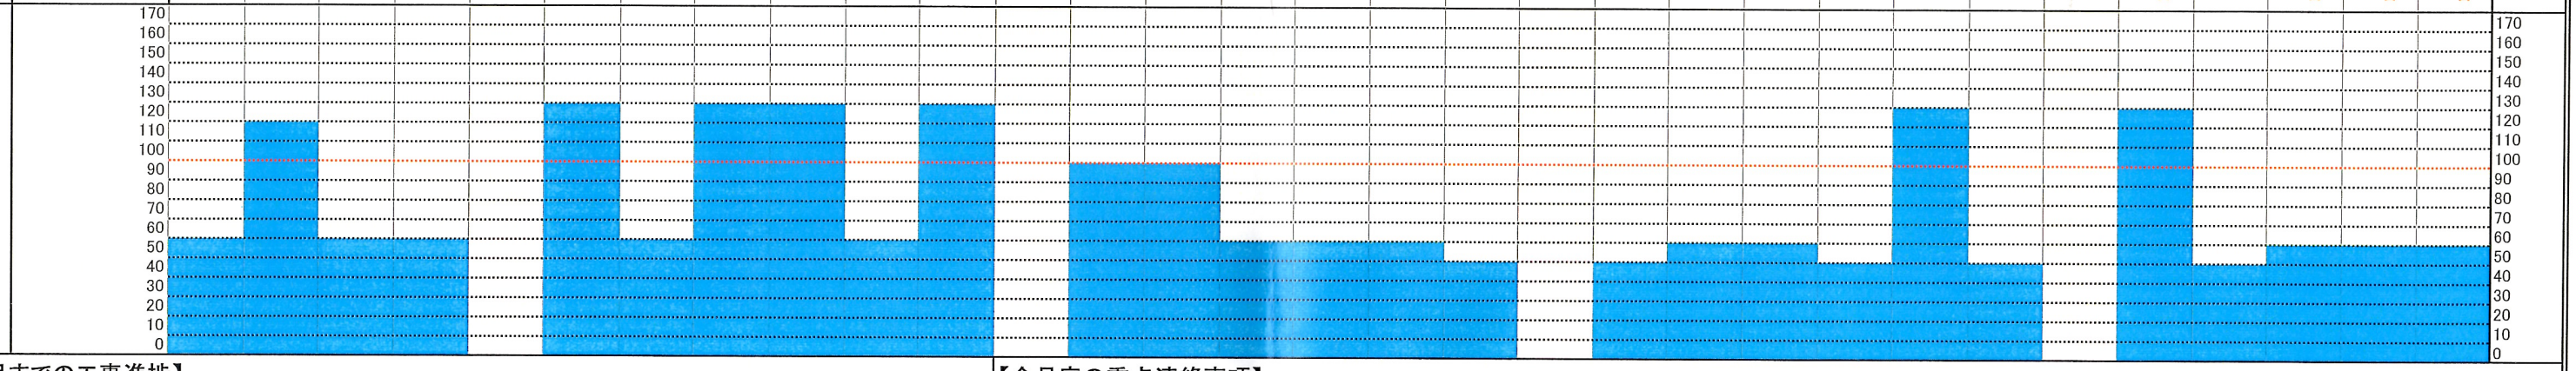

【先月までの工事進捗】

◎開発工事

・造成工事中です。

◎本体建物工事

・掘削工事は6月中に完了予定です。

・基礎躯体工事（コンクリート打設）は全体の90%程度完了しています。

・鉄骨工事は全体の80%程度完了しています。

【今月度の重点連絡事項】

・今月鉄骨工事開始及びコンクリト打設に伴い、搬出入車両台数が増えます。

・今月から内装工事着手に伴い、通勤車両・搬出入車両台数が増えます。

・搬出入ゲートが南側へ移動します。

・鉄骨工事に限り19:00まで残業を行います。

・コンクリートの鏝押え仕上作業については、作業時間を延長する場合があります。

※天候等の理由により日程を変更する場合があります。

※車両台数は予測台数です。増減が生ずる場合があります。

KANKEN 株式会社 関東建創

作成日：平成27年6月23日
