基本遵守事項（工事説明会資料より抜粋）	
1	作業時間は8:00～18:30、日曜日は休工とする
2	7:30～8:30の間は工事車両の搬出入を行わない
3	工事現場出入り口には、適宜誘導員を配置する
4	道路上には資材等を放置しない
5	騒音・振動防止法を遵守する

11　月度安全衛生管理計画

サクラシティ　高尾計画

戸建	事業主	：大和ハウス工業株式会社 日本住宅流通株式会社
	施工者	：
マンション	事業主	：大和ハウス工業株式会社 株式会社コスモスイニシア
	施工者	：株式会社長谷工コーポレーション

月間安全衛生管理工程表

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
戸建事業																														
マンション事業 仮設工事			★地上足場架設・解体工事																											
土工事																														
躯体工事					コンクリート				コンクリート								コンクリート			コンクリート				コンクリート				コンクリート		
自走駐工事	※作業はありません。																													
外装工事			★2F～10F外装仕上工事（屋上等のアスファルト防水工事に伴い、煙・匂いが発生致します）																											
内装工事			★2F～10F内装仕上工事																											
外構・植栽工事			★宅内排水設備他埋設工事、敷地境界廻りフェンス基礎工事、植栽工事																											
通行規制工事			★ガス引込設備工事（東京ガス工事）※仮囲い架設の為、一部歩道占有																											
安全衛生行事計画	休工日	安全大会				道路清掃		休工日					道路清掃	休工日	休工日					道路清掃		休工日		安全協議会 連絡会議			道路清掃		休工日	
大型ダンプ		☆敷地内残土運搬用																												
大型トラック、トレーラー									（鉄筋・型枠・PC・鉄骨・仮設材料・仕上材料）																					
4ｔトラック									（鉄筋・型枠・仮設材料・仕上げ材料）																					
生コン車									（コンクリート）																					
クレーン		☆敷地内常設のクレーン使用を基本とするが、工事の内容に応じラフタークレーンを臨時に使用する場合があります																												

1日あたりの車輌台数（台/日）

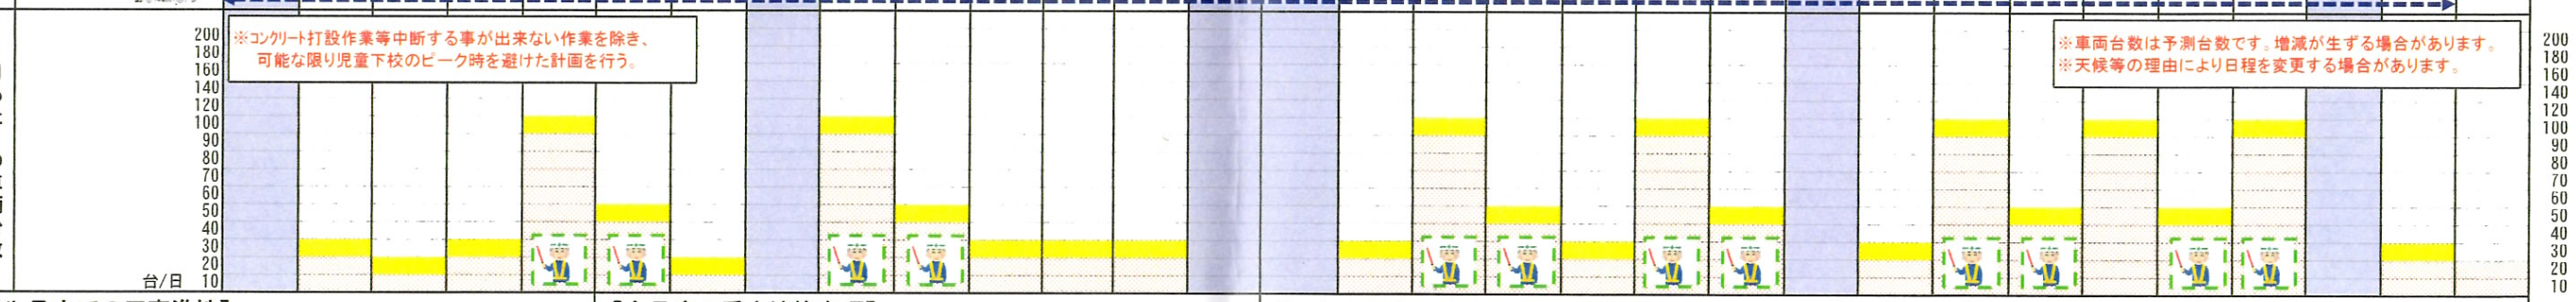

【先月までの工事進捗】

◎戸建事業

- 10月末現在41棟着工済み。
- 完成23棟。工事中18棟。

◎マンション事業

- Ⅰ工区A, B棟（10F建て）の躯体工事は完了。2F-10Fの内外装仕上げ工事を行いました。（ｸﾚｰﾝの解体、Ⅱ工区側への移動を行います。）
- Ⅱ工区C, D棟（14F建て）は3-4Fの躯体工事を行いました。
- 排水埋設、ﾌｪﾝｽ基礎等の外構工事を進めています。

【今月度の重点連絡事項】

◎戸建事業

- 11月着工は18棟予定。

◎マンション事業

- 2F-10Fの内外装仕上げ工事を行います。外装工事の進捗により足場の解体作業を行います。
- Ⅱ工区C, D棟（14F建て）は4-6Fの躯体工事を行いました。
- 各所　排水埋設、ﾌｪﾝｽ基礎、植栽等の外構工事を行います。
- ※ｺﾝｸﾘｰﾄの緩押えについては、作業時間を延長する事があります。

【工事車両搬入動線及び誘導員配置計画】
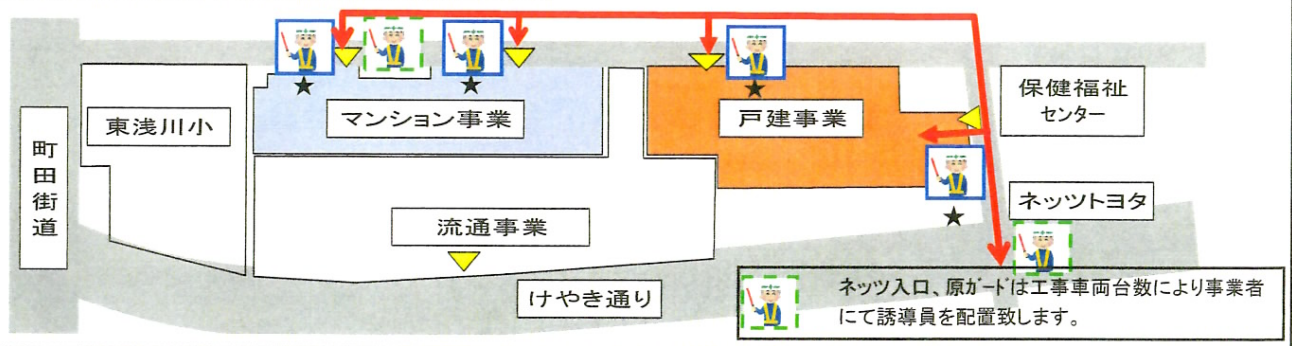
★工事車両の搬出入の予定がある場合は、誘導員を配置致します。
