基本遵守事項（工事説明会資料より抜粋）	
1	作業時間は8:00～18:30、日曜日は休工とする
2	7:30～8:30の間は工事車両の搬出入を行わない
3	工事現場出入り口には、適宜誘導員を配置する
4	道路上には資材等を放置しない
5	騒音・振動防止法を遵守する

12　月度安全衛生管理計画

サクラシティ　高尾計画

戸建	事業主　：大和ハウス工業株式会社 　　日本住宅流通株式会社 施工者　：
マンション	事業主　：大和ハウス工業株式会社 　　株式会社コスモスイニシア 施工者　：株式会社長谷工コーポレーション

月間安全衛生管理工程表

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
戸建事業	戸建新築工事		★12月の新規着工は5棟　12月完成は11棟予定																												
マンション事業	仮設工事		★地上足場架設・解体工事																												
	土工事																														
	躯体工事	コンクリート		コンクリート					コンクリート													コンクリート			コンクリート						
	自走駐工事	★内部仕上げ工事(電気・消防等設備、ライン・車止め等)																													
	外装工事	★2F～10F外装仕上工事　（屋上等のアスファルト防水工事に伴い、煙・匂いが発生致します）																													
	内装工事	★1F～10F内装仕上工事　（諸検査・是正工事・機器調整の作業については作業時間を延長する場合があります）																													
	外構・植栽工事	★宅内排水設備他埋設工事、表層仕上げ工事、敷地境界廻りフェンス基礎工事、植栽工事																													
	通行規制工事	★工事の予定はありません																													
安全衛生行事計画	安全大会			道路清掃		休工日					道路清掃		休工日					道路清掃		休工日		安全協議会 連絡会議			道路清掃		休工日			休工日	休工日
大型ダンプ																															
大型トラック、トレーラー	（鉄筋・型枠・PC・鉄骨・仮設材料・仕上材料）																														
4ｔトラック	（鉄筋・型枠・仮設材料・仕上げ材料）																														
生コン車	（コンクリート）																														
クレーン	☆敷地内常設のクレーン使用を基本とするが、工事の内容に応じラフタークレーンを臨時に使用する場合があります																														

1日あたりの車輌台数（台/日）

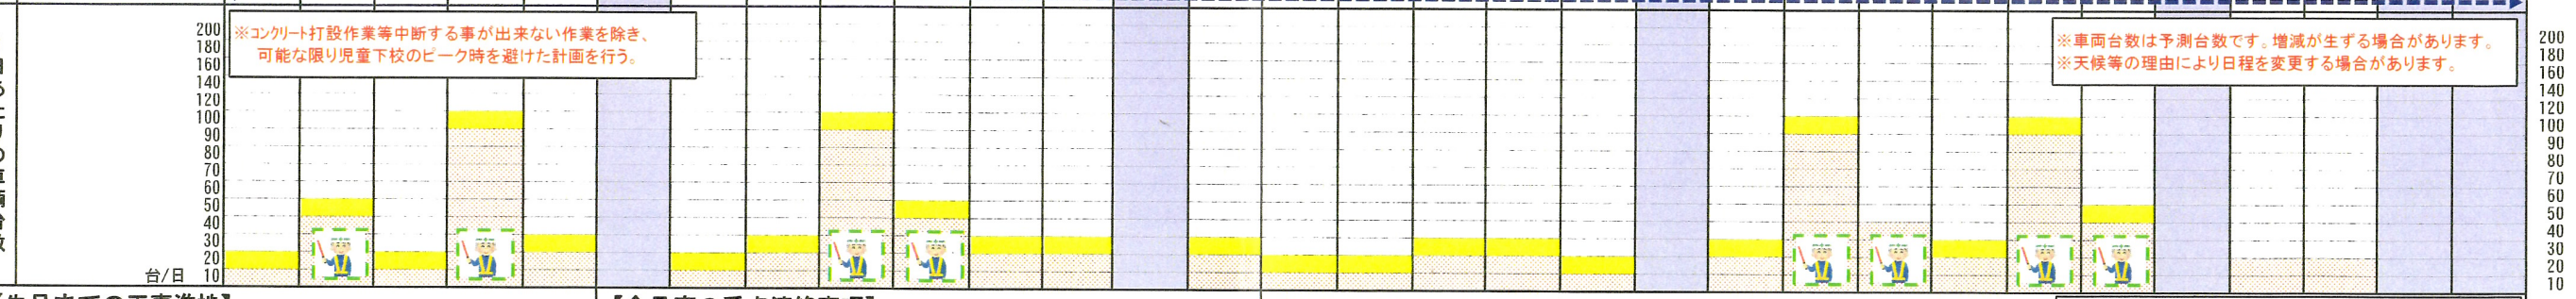

【先月までの工事進捗】

◎戸建事業

- 11月末現在着工済み52棟。
- 11月末現在29棟完成、21世帯入居済み。

◎マンション事業

- Ⅰ工区では本体棟の仕上工事、付属棟の躯体工事、及び外構工事を実施。一部足場の解体実施。内装仕上げ進捗は20%程です。
- 外構工事は敷地境界際ﾌｪﾝｽの設置、一部仮囲いの解体を実施。
- 各所埋設工事と並行して植栽工事を実施。
- Ⅱ工区C, D棟（14F建て）は5-6Fの躯体工事を実施。1F仕上工事を実施。

【今月度の重点連絡事項】

◎戸建事業

- 12月着工は5棟予定。
- 12月完成は11棟予定。

◎マンション事業

- Ⅰ工区では引続き本体棟の仕上工事、付属棟の躯体工事、及び外構工事足場解体を実施。2月初旬の工事完了を目標としています。
- Ⅱ工区C, D棟（14F建て）は6F-7Fの躯体工事及び1F-2Fの仕上工事を予定。
- ※ｺﾝｸﾘｰﾄの緩押え及び内装検査・是正工事、機器調整作業については、作業時間を延長する事があります。

【工事車両搬入動線及び誘導員配置計画】

★工事車両の搬出入の予定がある場合は、誘導員を配置致します。
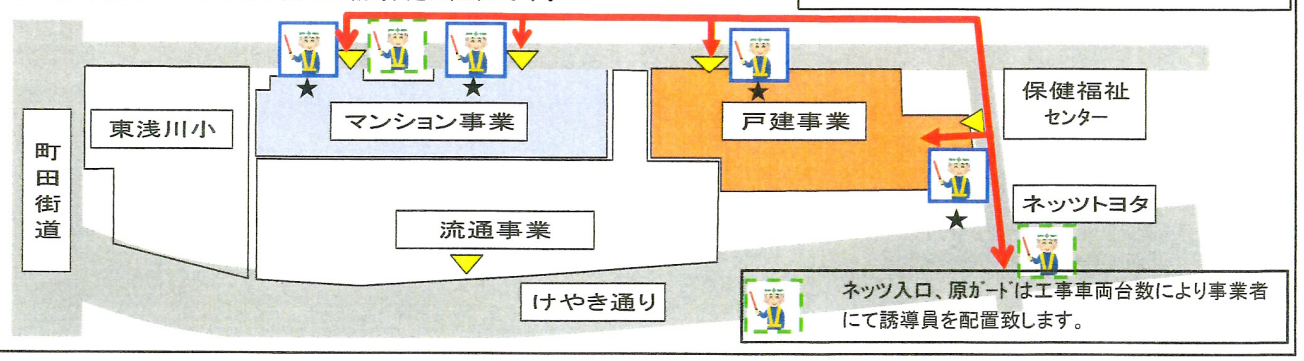
年末年始休工(12/30～1/3)は警備員による巡回警備及び24Hの機械警備を実施予定。
